

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ





ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان



وزارت کشور

استانداری کرمان

منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی

استان کرمان در سال ۱۳۹۵

بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و

پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)

شماره ۱: جهاد کشاورزی جنوب استان

استانداری کرمان - دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی

(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مقدمه	۱
۲- ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب	۴
۳- عناوین برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی	۷
۴- ابلاغیه رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استان ها	۲۰
۵- تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی جنوب	۲۲
۶- اهداف کمی پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی جنوب در سال ۱۳۹۵	۲۴
۷- نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)	۲۶
۸- منشور پروژه های جهاد کشاورزی جنوب	۲۹
۸-۱- افزایش ضریب خوداتکائی در محصولات اساسی (حبوبات ۴۸۳۹ تن)	۳۱
۸-۲- افزایش ضریب خود اتکایی محصولات اساسی (گندم)	۴۱
۸-۳- افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (طرح افزایش تولید جو به میزان ۷ هزارتن)	۴۹
۸-۴- افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (سیب زمینی ۲۴۸ هزارتن)	۵۷
۸-۵- توسعه کشت های گلخانه ای (احداث گلخانه) - ۱۳۰ هکتار	۶۵
۸-۶- تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی (سم - نظارت بر آفت کش ها در عرصه)	۷۳
۸-۷- توسعه سامانه های نوین آبیاری (۹۰۵۸ هکتار)	۸۱
۸-۸- احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (۴۰۰۰ هکتار)	۸۹
۸-۹- افزایش فرآورده ها و کاهش ضایعات در تولید محصولات کشاورزی	۹۷

- ۸-۱۰- تامین داخلی نهال اصلاح شده مورد نیاز(۲۲۲۸۰۱ اصله) ۱۰۵
- ۸-۱۱- افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید تخم مرغ ۱.۶ هزار تن)..... ۱۱۵
- ۸-۱۲- افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید گوشت مرغ ۱.۷ هزار تن)..... ۱۲۱
- ۸-۱۳- افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید گوشت قرمز ۱۱.۸۷ هزار تن)..... ۱۲۷

(۱) مقدمه:

"اقتصادمقاومتی" اصطلاحی است که در سال ۱۳۸۹ اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی‌های متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. اقتصادمقاومتی در حقیقت اقتصادی راترسیم می‌کند که توانایی مقابله با شوک‌های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلند مدت به سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساخت‌های اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملازمات تقویت گردد.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران در معرض فشارهای قدرت‌های معارض قرار گرفته و رقابت با کشورهای منطقه در برنامه اقتصادی کشور لحاظ شده است بنابراین توسعه اقتصاد مقاومتی از ضروریات سیاست‌گذاری امروز کشور است. سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، مبنای برنامه راهبردی است که ضمن در نظر گرفتن مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های گذشته، اهداف و اولویت‌های راهبردی جدید کشور را با رویکرد آینده‌نگری، تداوم سند چشم‌انداز و حفظ اقتصاد کشور در برابر فشارها و تهدیدها، ارائه می‌نماید.

استان کرمان دارای ظرفیت‌های بالقوه بالایی است که از جمله می‌توان به موقعیت جغرافیایی استان، ظرفیت بالای ترانزیتی که استان را به عنوان پلی ارتباطی میان استانهای کشور مطرح نموده، تنوع چهار فصل جهت توسعه بخش کشاورزی، ظرفیت بالای منابع معدنی و فسیلی از جمله مس، ذغال سنگ، سنگ آهن و ... و از همه مهم تر وجود سرمایه انسانی جوان و با دانش و مهارت بالا در استان اشاره کرد با داشتن چنین پتانسیلی تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی

در استان بایستی این باشد تا با رفع قوانین مزاحم و فراهم آوردن اختیارات لازم با استفاده از ظرفیت‌های یاد شده در بخش‌های مختلف به چنان بالندگی و رشدی دست یابند تا استان را به عنوان الگوی اجرایی طرح اقتصاد مقاومتی در سطح ملی قلمداد نمایند.

به طور کلی اهم اقدام‌های اجرایی در کشور و استان کرمان برای ساماندهی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل می‌باشد.

۱- ریاست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۷۹۰۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱، معاون اول رئیس‌جمهور را مسئول ساماندهی اقدامات بایسته در رابطه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمودند.

۲- معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ طی ۱۵ ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط و شورای عالی امنیت ملی، تکالیف هر دستگاه را تعیین و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تلفیق و تهیه برنامه‌های اجرایی نمودند.

۳- در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ ((شورای اقتصاد)) به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین گردید. مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان ((مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی)) در تابستان سال ۱۳۹۳ منتشر گردید (متن کامل کتاب مزبور از طریق وبگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل دسترسی است)

۴- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب بر اساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت/۵۲۴۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل گردید ستاد مزبور تا کنون

جلسات متعددی برگزار نموده است و از جمله مصوبات آن تصویب برنامه های ملی ، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی است .

۵- تصویب ساختار اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای توسعه

و برنامه ریزی استان و ابلاغ به دستگاه های اجرایی استان

۶- تشکیل کار گروه های پنج گانه ذیل ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی و ستادهای اقتصاد مقاومتی شهرستان های استان بر اساس برنامه زمانبندی

۷- انتخاب استان کرمان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در جلسه شورای اداری استان مورخ ۹۵/۲/۲۵ با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی

۸- انطباق برش استانی برنامه های ملی دستگاه های اجرایی استان با نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)

مجموعه حاضر با هدف آشنایی و دسترسی مناسب دستگاه های اجرایی استان با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی(جهاد کشاورزی جنوب استان) مبتنی بر نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا) توسط دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهیه و تدوین گردیده و به عنوان برنامه اجرای و عملیاتی دستگاه تلقی می گردد.

در خاتمه با تقدیر و تشکر از کلیه همکاران به خصوص همکاران دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه های اجرای مرتبط به خاطر تلاش های صورت پذیرفته در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان از کلیه صاحب نظران، دانشگامیان و سایر عزیزانی که دغدغه پیشرفت و توسعه استان را دارند تقاضا دارم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان منعکس نمایند.

علیرضا رزم حسینی

استاندار کرمان

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان

۲) ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رهبر

معظم انقلاب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زاء، پیشرو و برون گرا ابلاغ می گردد:

- ۱- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
- ۲- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
- ۳- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
- ۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
- ۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
- ۶- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
- ۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا.

- ۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
- ۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
- ۱۰- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
 - گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
 - تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
 - برنامه ریزی تولید ملی متناسب بانيازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
 - استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
 - ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
- ۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
- ۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
 - استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
 - استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
- ۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش های فروش.
 - مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
 - افزایش صادرات گاز.
 - افزایش صادرات برق.
 - افزایش صادرات پتروشیمی.
 - افزایش صادرات فرآورده های نفتی.
- ۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
- ۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
- ۱۶- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید.
- ۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
- ۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
- ۱۹- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...
- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
- ۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

- رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن

۳) عناوین برنامه های ملی و طرح های مصوب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی

۱- برنامه ملی ارتقای بهره وری

۲- برنامه ملی پیش برد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)

۳- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)

۴- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

۵- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

۶- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

۷- برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

۸- برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

۹- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره

پایین دستی و توسعه بازار

۱۰- برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها

۱۱- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

۱۲- سیاست های ارزی، پولی و مالی

۱- برنامه ملی ارتقای بهره وری

(رئیس : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دبیر : سازمان ملی بهره وری ایران

۱- طرح ارتقای بهره وری نیروی کار (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)

۲- طرح ارتقای بهره وری سرمایه (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۳- طرح ارتقای بهره وری انرژی (وزارت نفت)

۴- طرح ارتقای بهره وری آب (وزارت جهاد کشاورزی)

۵- طرح ارتقای بهره وری در زنجیره تولید و مصرف گندم ، آرد و نان (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)

۲- برنامه ملی پیش برد برون گرایی اقتصاد

(توسعه صادرات غیر نفتی)

(رئیس: وزیر امور اقتصادی و دارایی)

دبیر: امور اقتصاد کلان

۱- طرح توسعه صادرات غیر نفتی (سازمان توسعه تجارت ایران)

۲- طرح جذب سرمایه گذاری خارجی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران)

۳- طرح دیپلماسی اقتصادی (وزارت امور خارجه)

۴- طرح توسعه ظرفیت های صادراتی مناطق آزاد (شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی)

۵- طرح توسعه زیر ساخت های تجارت خارجی و ترانزیت (وزارت راه و شهرسازی)

۶- طرح توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بین الملل و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور)

۳- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

(رئیس : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دبیر: معاونت توسعه امور تولیدی

- ۱- طرح سیاست های پولی و اعتباری (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
- ۲- طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)
- ۳- طرح گسترش پوشش استاندارد (سازمان استاندارد ایران)
- ۴- طرح امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی (وزارت جهاد کشاورزی)
- ۵- طرح توسعه رقابت پذیری اقتصاد (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- ۶- طرح تقویت نظام تامین منابع مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- ۷- طرح توسعه تولید صنایع دستی، فرش و گردشگری (سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری)
- ۸- طرح سیاست های تجاری (کنترل واردات) متناسب با توان داخلی کشور (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)
- ۹- طرح رقابت پذیر کردن استان ها (وزارت کشور)
- ۱۰- طرح توسعه ونوسازی صنایع کشور (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)
- ۱۱- طرح توسعه معدن و صنایع معدنی (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)
- ۱۲- طرح بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۴- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه

عدالت اجتماعی

(رئیس : وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)

دبیر: امور برنامه ریزی ، آمایش سرزمین و محیط زیست

۱- طرح عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۲- طرح تحقق عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انفال (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۳- طرح توانمندسازی فقرا و محرومین (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۴- طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۵- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و

قطع وابستگی بودجه به نفت

(رئیس: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دبیر: امور تلفیق بودجه

- ۱- طرح اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۲- طرح پایداری منابع درآمدی دولت (سازمان امور مالیاتی کشور)
- ۳- طرح بهینه سازی اندازه و ساختار دولت (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۴- طرح اصلاح ساختار مالی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- ۵- تقویت خود اتکایی استانها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۶- شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۷- طرح افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تا قطع کامل وابستگی بودجه و نفت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۶- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

(رئیس : وزیر صنعت ، معدن و تجارت)

دبیر: امور تحقیقات و فناوری

- ۱- طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)
- ۲- طرح افزایش روند رشد نوآوری (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور)

۷- برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد

مقاومتی

(رئیس : رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دبیر: امور فرهنگ ، گردشگری و ورزش

- ۱- طرح تشویق همکاری های جمعی و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد (سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
- ۲- طرح تقویت فرهنگ مدیریت جهادی (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۳- طرح اصلاح رفتارهای فعالان اقتصادی و خانوارها (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- ۴- طرح گفتمان سازی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

۸- برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

(رئیس : وزیر امور اقتصادی و دارایی)

دبیر: معاونت توسعه مدیریت

- ۱- طرح دولت الکترونیک و همراه (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۲- طرح مبارزه با اقتصاد زیر زمینی و قاچاق (وزارت کشور)
- ۳- طرح شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی ، اداری و اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- ۴- طرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
- ۵- طرح توسعه و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت (وزارت دادگستری)

۹- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل
 زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
 (رئیس : وزیر نفت)

دبیر: امور انرژی

- ۱- طرح توسعه صنایع مبتنی بر نفت و گاز (وزارت نفت)
- ۲- طرح افزایش سهم تجارت نفت و گاز و فرآورده های نفتی
 در بازارهای جهانی (وزارت نفت)
- ۳- طرح ایجاد تنوع در بازارهای هدف (وزارت نفت)
- ۴- طرح توسعه فناوری و تحقیق و پژوهش در نفت و گاز (وزارت
 نفت)
- ۵- طرح ایجاد ذخایر راهبردی به منظور اثر گذاری در بازارهای
 جهانی (وزارت نفت)
- ۶- طرح افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از میداین مشترک
 (وزارت نفت)

۱۰- برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها

(رئیس : معاون اجرایی رئیس جمهور)

دبیر: امور اقتصاد کلان

- ۱- طرح استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه در فعالیت های
 تولید کالا و خدمات (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- ۲- طرح بهره گیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش
 میزان یارانه مصرفی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۱۱- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

(رئیس : وزیر امور اقتصادی و دارایی)

دبیر: امور بنگاه ها ، شوراهای و توسعه مشارکت های

مردمی

۱- طرح توانمند سازی بخش خصوصی (وزارت امور اقتصادی

و دارایی)

۲- طرح اصلاح نظام مالی برای واگذاری فعالیت ها به بخش

غیر دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۳- طرح تداوم و تسریع اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۳۴

(وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۴- طرح محدود کردن نقش و وظایف دولت به امور حاکمیتی

و تصدی های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر (وزارت امور

اقتصادی و دارایی)

۵- طرح کاهش نقش دولت در اجرای طرح های عمرانی

(وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۱۲- سیاست های ارزی، پولی و مالی

(رئیس : رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا.)

رئیس: رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا.

۱- طرح ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور

(بانک مرکزی ج.ا.ا.)

۲- طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار یا افتضانات اقتصادی

(بانک مرکزی ج.ا.ا.)

بسمه تعالی

میثاق نامه همدلی در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

همراهی و همدلی تصمیم سازان و مجریان با محور قرار دادن مشارکت آحاد جامعه جهت توسعه پایدار بر اساس اقتصاد مقاومتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و این مهم به ظرافت در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اشاره گردیده است. از آن جایی که در استان کرمان در این راستا و با تأکید بر ارتقاء سرمایه های اجتماعی و افزایش همگرایی و هم افزایی لازم برای پیاده سازی سیاست‌ها و اقدامات توسعه ای، ایده مثلث توسعه با مشارکت انجمن جمع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی و کارآفرینان محترم در راستای اقتصاد مقاومتی تدوین و عملیاتی گردیده است، مجدداً ما اعضا کنندگان ذیل این میثاق نامه، همه توان خویش را برای جامه عمل پوشاندن به شعار امسال، که توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامیده شده است، همگام با سیاست‌های دولت محترم مصروف می نماییم.

انجمن جمع (اقدام و عمل در سایه وفاق عمومی و جمعی در استان)

کرمان

ردیف	نام و نام خانوادگی	دستگاه اجرای سمت	اعضاء
۱.	سید جیحی جعفری	نماینده ولی فقیه در استان	
۲.	علیرضا رزم حسینی	استاندار	
۳.	محمد مهدی زاهدی	نماینده مردم کرمان و دیلم	
۴.	محمد رضا پور ابراهیمی	نماینده مردم کرمان و راور	
۵.	حسین امیری	نماینده مردم زرنند و کهنوج	
۶.	آذین	نماینده مردم رفسنجان و نیک	
۷.	فتاحی	نماینده مردم شهر بایک	
۸.	شهباز حسن پور	نماینده مردم سیرجان و بردسیر	
۹.	غضنفر آبادی	نماینده مردم بهمینر، ماشیر، دیرگان و فوج	

(اقدام و عمل در سایه وفاق عمومی و جمعی در استان

کرمان

ردیف	نام و نام خانوادگی	دستگاه اجرای سمت	اعضاء
۱۰	فرح الله عارفی	نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد	
۱۱	امیری	نماینده مردم کهزج، قلعه گنج و رودبار جنوب	
۱۲	منظری توکلی	نماینده مردم بافت، ایر و ارزوئیه	
۱۳	محمدی انارکی	نماینده منتخب مردم رفسنجان و انار	
۱۴	اسدی	نماینده منتخب مردم شهریارک	
۱۵	بیکرادی	نماینده منتخب مردم بهمن‌ماشیر، بزرگان و فهرج	
۱۶	کمالی پور	نماینده منتخب مردم جیرفت و عنبر آباد	
۱۷	حمزه ای	نماینده منتخب مردم کهزج، قلعه گنج و رودبار جنوب	
۱۸	بختجاری	نماینده منتخب مردم بافت، ایر و ارزوئیه	
۱۹	پدافه موحد	رئیس داد گشتری	
۲۰	محسن جلال پور	رئیس اتاق بازرگانی	
۲۱	حمید ذکا اسدی	معاون استاندار	
۲۲	ابوالقاسم سیف الهی	معاون استاندار	
۲۳	محمدرضا فوت	معاون استاندار	
۲۴	جعفر رودری	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی	
۲۵	حامد جباری	مدیر کل اطلاعات	
۲۶	احمد آبیار	مدیر کل بازرسی	
۲۷	عباس سعیدی	مدیر کل جهاد کشاورزی استان	
۲۸	سردار توری	فرمانده لشکر ۱۱۰۰۰	
۲۹	اسعدرادی بنی اسدی	فرمانده نظامی استان	
۳۰	سید یعقوب موسوی	مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان	
۳۱	محمود سلطانی زاده	مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان	
۳۲	محمود اسکندری نسب	مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان	
۳۳	محمود وفاتی	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	
۳۴	محمد مهدی بلوردی	مدیر کل راه و شهرسازی استان	
۳۵	ساردی	مدیر کل راه و شهرسازی جنوب	
۳۶	حمید شیخ اسدی	مدیر کل امور اقتصادی و دارایی	
۳۷	محمد رضا قادری	مدیر کل گمرک	
۳۸	مهدی رحیمی زاده	مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان	
۳۹	محمد حسن کردستانی	مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان	
۴۰	حسین رشیدی	مدیر کل دامپزشکی استان	
۴۱	علی احمدی	مدیر کل دامپزشکی جنوب استان	
۴۲	محمد رضا بختجاری	مدیر عامل آب منطقه ای	
۴۳	علی اصغر نصر الهی	مدیر عامل برق منطقه ای	

(اقدام و عمل در سایه وفاق عمومی و جمعی در استان

کرمان

ردیف	نام و نام خانوادگی	دستگاه اجرای سمت	امضاء
۴۴	محمود محمودی نیا	مدیر کل ورزش و جوانان	
۴۵	محمد طاهری	مدیرعامل آب و فاضلاب استان	
۴۶	حسن امیری	رئیس شورای هماهنگی بانکها	
۴۷	علی اکبر حقدوست	رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان	
۴۸	محمود صفرزاده	مدیرکل حفاظت محیط زیست	
۴۹	دکتر محمد علی طاهر	رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان	
۵۰	دکتر رشیدی	رئیس دانشگاه پیام نور	
۵۱	دکتر آل فسه	رئیس دانشگاه آزاد کرمان	
۵۲	دکتر عنایت الله معافی	رئیس دانشگاه علمی کاربردی کرمان	
۵۳	دکتر حسین مهرابی بشرآبادی	رئیس دانشکده فنی شهید چمران	
۵۴	علی اکبر مشرفی	رئیس شورای شهر کرمان	
۵۵	محمد رفیع آبادی پور	رئیس شورای اسلامی استان	
۵۶	علی بابایی	شهردار کرمان	
۵۷	یوسف جعفری	رئیس اتاق اصناف	
۵۸	جواد سلاجقه	رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان	
۵۹	مهندس رخ	رئیس سازمان نظام مهندسی معدن	
۶۰	محسن کمال الدینی	رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی	

آئینه جمعی

(نظارت)

نمایندگان
دولتسرمایه گذاران
و کارآفرینان

۴) ابلاغیه رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به

استانها

استانداران محترم سراسر کشور

با سلام؛

در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدضله العالی) و با عنایت به نام گذاری سال ۱۳۹۵ توسط معظم له به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » و به استناد مفاد بند (۳) مصوبه شماره ۵۲۴۴۲/۸۵۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیأت محترم وزیران و مصوبات چهارده گانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که همگی در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ طی شماره های (۷۸۹۳-۷۸۹۴-۷۵۹۸-۷۹۹۰-۷۹۹۲-۷۹۹۴-۷۹۹۷-۸۰۰۲-۸۰۰۳-۸۰۰۵) متعاقباً ابلاغ خواهد شد و در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و در جهت ایجاد رونق اقتصادی، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال، استانداران سراسر کشور موظفند:

۱- با برگزاری جلسات منظم هفتگی ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موانع اجرایی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را شناسایی و متناسب به اختیارات تفویضی نسبت به رفع آنها اقدام و الباقی را جهت رفع موانع به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع و گزارش آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ارسال نمایند.

۲- پروژه های پیشنهادی استانی خود را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» (نیپا) تدوین و پس از تأیید در ستاد استانی برای تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ارسال نمایند

۳- ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کلیه واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی هر گونه همکاری لازم را حسب درخواست دستگاه مجری به عمل آورده و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ارائه دهند.

۴- گزارشات تحلیلی با اطلاعات لازم را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» (نیپا) تهیه و از طریق دبیرخانه استانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که متناظراً در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ارسال نمایند.

۵) تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی

<<ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی >> در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ (هجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران و در ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۵ که توسط معظم له به عنوان سال <<اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل >> نامگذاری شده است ، پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ، تصویب نمود :

الف) « وزارت جهاد کشاورزی » به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه های اولویت دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد :

ردیف	عنوان پروژه	عنوان برنامه ملی
۱	افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی شامل: ۱- گندم ۱۱۸۰۰ هزار تن، ۲- شلتوک ۲۹۴۹ هزار تن ۳- دانه های روغنی ۴۹۷ هزار تن، ۴- سیبزمینی ۵۰۶ میلیون تن، ۵- حبوبات ۷۰۰ هزار تن، ۶- پنبه ۲۰۶ هزار تن، ۷- شیر خام ۹۶۵۲ هزار تن ۸- گوشت قرمز ۸۱۹ هزار تن، ۹- گوشت طیور ۲۱۷۹ هزار تن ۱۰- تخم مرغ ۹۵۱ هزار تن ۱۱- چغندر قند ۵۸۳۰ هزار تن ۱۲- جو ۳۱۰۰ هزار تن ۱۳- ذرت دانه ای ۲۲۰۰ هزار تن	ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)
۲	احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان ۱۵۰ هزار هکتار	ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)
۳	ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین	ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان ۱.۶۲ اسب بخار بر هکتار	۴
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: بذر (گندم ۴۰۶۰۰۰ تن، برنج ۴۷۲۵ تن، چغندر قند ۱۷۵۰۰ یونیت، سیب زمینی بذری (در سطح) ۳۰۰۰ هکتار، دانه های روغنی ۸۳۶۰ تن، حبوبات ۳۶۰۷ تن، پنبه ۴۱۴۷ تن، ذرت ۱۶۲۰۰ تن، جو ۵۳۰۰۰ تن)	۵
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: نهال‌های اصلاح شده (۱۸.۶ میلیون اصله)	۶
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: سم (۷۳۵۰۰۰ هکتار)، کود (۳۲۹۵ هزار هکتار)	۷
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۱۷۷۷ هکتار از واحدهای گلخانه‌ای	۸
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه های سایر مناطق به میزان ۶۵۰ هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانونهای بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی و ریزگردها به میزان ۹۰ هزار هکتار	۹
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	توسعه آبی‌پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۲۰۰۰۰ تن در آبهای شمال و جنوب کشور	۱۰
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	کاهش ضایعات از طریق فراوری ۱۹۷۰۰۰ تن	۱۱
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان ۱۹۷۲۰۰۰ تن	۱۲
ارتقای بهره‌وری	توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار	۱۳
ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)	مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و ...)	۱۴

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه های مندرج در بند (الف) ضروری است:

۱- پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

ج) کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با « دستگاه مجری » برای اجرای پروژه های اولویت دار « مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی » برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده « دستگاه مجری » است.

د) اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.

و) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از « دستگاه مجری » و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.

۶) نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)

- **رویکردهای اقتصاد مقاومتی** : ۱- عدالت بنیانی
- ۲- مردمی بودن ۳- دانش بنیانی ۴- درونزائی ۵- برونزائی
- **سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی** : سیاست هایی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و حاکم بر تمام برنامه ها ، طرح ها، پروژه ها و اهداف دستگاه های اجرایی خواهد بود.
- **نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)**: شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام نامه‌ها و سیستم های اطلاعاتی پشتیبان فرآیند هدف گذاری، تعریف طرح‌ها و پروژه ها، پایش پیشرفت پروژه ها، یادگیری ، اصلاح و روز آمدسازی را بر عهده دارد.
- **دستگاه های اجرایی**: به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی ، دستگاه اجرایی گفته خواهد شد.
- **سند منشور پروژه ها**: سند منشور پروژه، به پروژه موجودیت و اعتبار می بخشد. منشور پروژه در مورد اهداف، محدوده ، ذینفعان، فازها و ساختار شکست کار پروژه صحبت می کند. باید «مختصر» و «مفید» بوه و در عین حال «کامل» تهیه گردد. این سند باید در دسترس کلیه ذینفعان کلیدی قرار گیرد، تا یک دیدگاه مشترک نسبت به اطلاعات کلی و اهداف ،محدوده و خروجی های پروژه وجود داشته باشد. و بایستی شامل بخشهای ۱۰ گانه ی زیر باشد:

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

۱-افزایش تولید گندم به میزان ۹۹۸۴۵ تن

۲- توسعه آبیاری موضعی «نوار تیپ» در سطح ۳۰۰۰ هکتار

شماره	عنوان هدف	۱	۲	۳
	فرمول محاسبه	هکتار	تن	کیلوگرم در هکتار
۱۳۹۴-۱۳۹۵		۳۵۴۳۰	۹۹۸۴۵	۲۸۱۸
۱۳۹۵-۱۳۹۶		۳۳۰۱۴	۱۰۵۰۲۳	۳۱۸۱
۱۳۹۶-۱۳۹۷		۳۰۵۹۸	۱۰۹۹۹۹	۳۵۹۵
۱۳۹۷-۱۳۹۸		۳۰۵۹۸	۱۱۴۹۲۴	۳۷۵۶
۱۳۹۸-۱۳۹۹		۳۰۵۹۸	۱۱۸۱۰۷	۳۸۶۰
۱۳۹۹-۱۴۰۰		۳۰۵۹۸	۱۲۲۱۸۶	۳۹۹۳
۱۴۰۰-۱۴۰۱		۳۰۵۹۸	۱۲۶۴۱۷	۴۱۳۱
۱۴۰۱-۱۴۰۲		۳۰۵۹۸	۱۲۹۷۰۰	۴۲۳۹
۱۴۰۲-۱۴۰۳		۳۰۵۹۸	۱۳۲۹۸۴	۴۳۴۶
۱۴۰۳-۱۴۰۴		۳۰۵۹۸	۱۳۶۲۷۳	۴۴۷۰

* منشور پروژه تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال

۹۵ تعریف شده است

۳- ذینفعان پروژه:

- ۱- اقتصاد کلان کشور ۲- بهره‌برداران بخش کشاورزی
 - ۳- سیستم حمل و نقل ۴- واحدهای خدماتی ۵- صنایع وابسته
- به بخش کشاورزی

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- ۱- تامین منابع اعتباری و تسهیلاتی طرح ۲- فعالیت‌های محوری احیاء سازمان تشکیلاتی، توسعه و تجهیز نیروی انسانی
- ۳- فعالیت‌های محوری توسعه تکنولوژی مناسب و فن آوری‌های کاربردی ۴- فعالیت‌های محوری تامین و توسعه منابع سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

۵- شرح کلی پروژه:

بدنبال ارتقاء توان تولید ملی و در جهت امنیت غذایی و همچنین افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (گندم) در قالب مدیریت اصول مزرعه تحت عناوین کلی ، بهزراعی ، مدیریت مزرعه، کنترل و نظارت فنی، آموزش، حفظ محصول و مصرف بهینه آب در شهرستانهای جنوبی استان(جیرفت، کهنوچ، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان، قلعه گنج و فاریاب) اجرا می گردد.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

ردیف	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	اطلاع رسانی به کشاورزان	آگاهی کشاورز	۹۵/۶	۹۵/۷
۲	عقد قرارداد کشت بین مراکز جهادکشاورزی و کشاورزان	فرم های قرارداد کشت	۹۵/۷	۹۵/۹
۳	نظارت و مساعدت در فرایند کاشت	سطح زیرکشت	۹۵/۹	۹۵/۱۲
۴	نظارت بر داشت	عملکرد بر واحدسطح	۹۶/۱	۹۶/۳
۵	نظارت و مساعدت بر فرایند برداشت	محصول تولید شده	۹۶/۱	۹۶/۳

۷- بودجه پروژه:

اعتبارات هزینه ای ۲۱۱۰۲ میلیون ریال
 اعتبارات تملکی ۱۱۰۱۰ میلیون ریال
 یارانه خرید بذر ۲۸۰۰۰ میلیون ریال
 تسهیلات نقدینگی ۱۷۹۴۲۱ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه :


مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار و هزینه کرد اعتبارات تخصیصی

مدیر زیرپروژه: آقای اسلام شاهرخی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: پیگیری در جهت تحقق عملیات اجرائی ابلاغی ستاد و رعایت الگوی کاشت و تولید و اجراء پروژه های مربوطه، نظارت بر اجرای کار، هماهنگی کلیه واحدهای مرتبط با پروژه، نظارت بر تأمین و توزیع نهاده ها، هماهنگی های بین ستاد و حوزه های اجرائی، انجام مناسب و بموقع عملیات اجرائی تولید محصول سالم و عرضه بموقع

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

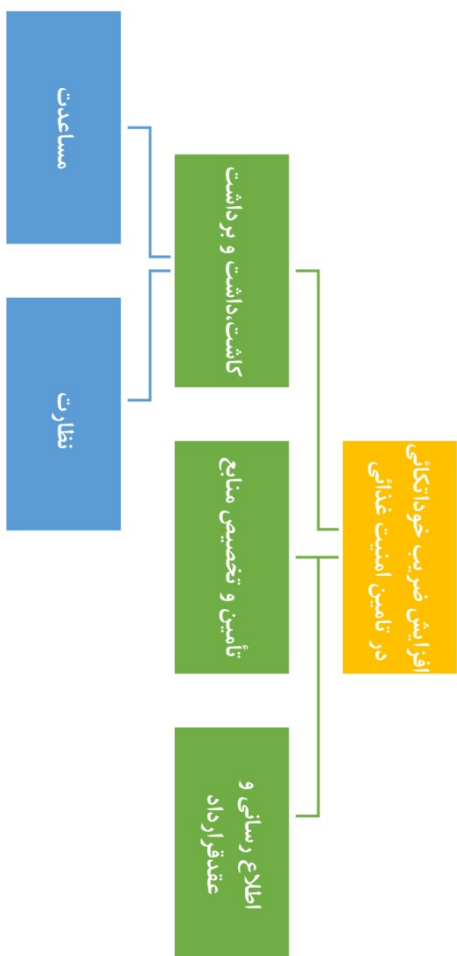

۱۰- برنامه زمانبندی :

کد WBS	۱	۲	۳	۴	۵
فعالیت	اطلاع رسانی	عقد قرارداد کشت بین مراکز جهاد کشاورزی و کشاورزان	نظارت و مساعدت در فرایند کاشت	نظارت و مساعدت در فرایند داشت	نظارت و مساعدت در فرایند برداشت
زمان آغاز	۹۵/۰۶	۹۵/۷	۹۵/۸	۹۵/۹	۱۳۹۶/۱۱
زمان پایان	۹۵/۷	۹۵/۹	۹۵/۹	۹۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۳
پیش نیاز	-	الزام به عقد قرارداد	تامین سرمایه در گردش	تامین اعتبارات هزینه ای	تامین اعتبارات و تسهیلات حوزه مکانیزاسیون برداشت
مسئول	روابط عمومی	معاون بهبود تولیدات گیاهی	مدیر زراعت	مدیر زراعت	مدیر مکانیزاسیون
خروجی ملموس	آگاهی کشاورز	فرم های قرارداد کشت	سطح زیر کشت	عملکرد بر واحد سطح	محصول تولید شده
وزن فعالیت	۵	۵	۲۵	۴۰	۲۵
توضیحات					

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (طرح افزایش تولید جو به میزان ۳۱۰۰ هزارتن)

پروژه متناظر استانی(جنوب):

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (طرح افزایش تولید جو به میزان ۷ هزارتن)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

-ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

-افزایش تولید جو به میزان ۷۰۰۰ تن

-توسعه آبیاری موضعی (نوار تیپ) در سطح ۳۰۰ هکتار

اهداف کمی در خوداتکایی تولید جو(میزان افزایش تولید جو)

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی	تولید	سطح زیر کشت	عملکرد در واحد سطح
	اهداف دو ساله	اهداف سه ساله				
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	۷	۲	۱۳
	۱۳۹۷			۸	۲	۱۲۲
	۱۳۹۸			۸	۲	۱۲۵
	۱۳۹۹			۸	۲	۱۳۱
	۱۴۰۰			۹	۲	۱۳
	۱۴۰۱			۹	۲	۲۶۸
	۱۴۰۲			۱۰	۲	۲۸۲
	۱۴۰۳			۱۰	۴	۲۰۹
	۱۴۰۴			۱۱	۴	۲۰۳
				۱۱	۵	۱
			شاخص اندازه گیری عملکرد ۱۳۹۳	۱۱	۵	۱
			عملکرد ۱۳۹۴	۱۲	۶	۱

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال

۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳- ذینفعان پروژه:

بهره‌برداران کشاورزی، مصرف کنندگان (بخش مردمی اقتصاد)، ناوگان حمل و نقل، صاحبان کارخانجات صنایع تبدیلی و فرآوری محصول، اقتصاد کلان کشور (ممانعت از خروج ارز از کشور، ارتقا توان تولید)

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- تامین منابع اعتباری و تسهیلات طرح
- فعالیت‌های محوری در جهت توسعه ساختار تشکیلاتی، توسعه و تجهیز نیروی انسانی
- اعتبار لازم جهت خرید ادوات خاک ورزی حفاظتی
- توسعه شبکه آبیاری

۵- شرح کلی پروژه:

بدنبال ارتقاء توان تولید ملی و در جهت امنیت غذایی و همچنین افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (افزایش تولید جو بمیزان ۷ هزار تن) با احداث مزارع الگویی و آرمانی، خاکورزی حفاظتی، حاصل خیزی خاک و بهبود تغذیه گیاهی، تولید و تامین بذر، افزایش کارایی مصرف آب، افزایش ضریب و سطح مکانیزاسیون و خرید تجهیزات فنی در شهرستانهای جنوبی استان (جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان، قلعه گنج و فاریاب) اجرا می گردد.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

طرح به مدت یکسال زراعی از ابتدا تقویم زراعی شروع و تا پایان برداشت ادامه دارد (کاشت در پائیز، داشت در زمستان و برداشت در اوایل بهار)

ردیف	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	اطلاع رسانی به کشاورزان	آگاهی کشاورز	۹۵/۶	۹۵/۷
۲	عقد قرارداد کشت بین مراکز جهاد کشاورزی و کشاورزان	فرم های قرارداد کشت	۹۵/۷	۹۵/۹
۳	نظارت و مساعدت در فرایند تولید	سطح زیرکشت	۹۵/۹	۹۵/۱۲
۴	نظارت بر داشت	عملکرد بر واحد سطح	۹۶/۱	۹۶/۳
۵	نظارت و مساعدت بر فرایند برداشت	محصول تولید شده	۹۶/۱	۹۶/۳

۷- بودجه پروژه:

اعتبارات هزینه ای ۱۸۱۰ میلیون ریال
 اعتبارات تملکی ۱۲۰۲ میلیون ریال
 یارانه خرید بذر ۵۰۱ میلیون ریال
 تسهیلات نقدینگی ۴۴۸۵۵ میلیون ریال


۸- ساختار پروژه

مدیر پروژه: آقای سید یعقوب موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان
 وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: مدیریت امور زراعت زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت

اطلاع رسانی و عقد قراردادها، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

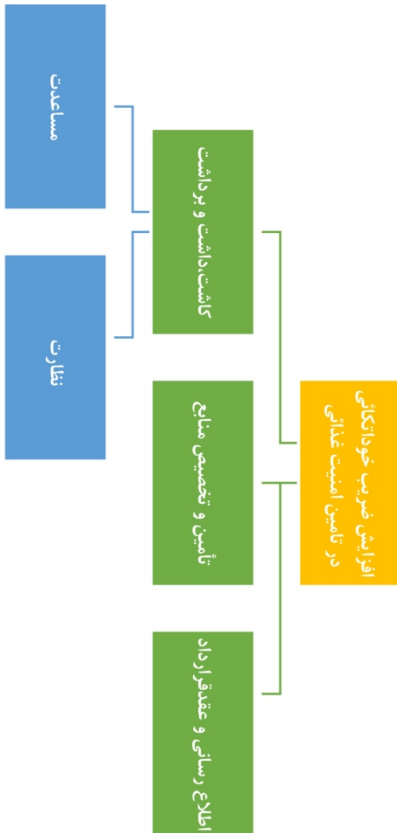

۱۰- برنامه زمانبندی

WBS کد	۱	۲	۳
فعالیت	اطلاع رسانی	عقد قرارداد کشت بین مراکز جهاد کشاورزی و کشاورزان	نظارت و مساعدت در فرایند کاشت
زمان آغاز	۹۵/۰۶	۹۵/۷	۹۵/۸
زمان پایان	۹۵/۷	۹۵/۹	۹۵/۹
پیش نیاز	-	الزام به عقد قرارداد	تامین سرمایه در گردش
مسئول	روابط عمومی	معاون بهبود تولیدات گیاهی	مدیر زراعت
خروجی ملموس	آگاهی کشاورز	فرم های قرارداد کشت	سطح زیر کشت
وزن فعالیت	۵	۵	۲۵
هزینه (میلیارد ریال)	-	-	۳۱.۳

۴	۵
نظارت و مساعدت در فرایند دریافت داشت	نظارت و مساعدت در فرایند برداشت
۹۵/۹	۱۳۹۶/۱
۹۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۳
تامین اعتبارات هزینه ای	تامین اعتبارات و تسهیلات حوزه مکانیزاسیون برداشت
مدیر زراعت	مدیر مکانیزاسیون
عملکرد بر واحد سطح	محصول تولید شده
۴۰	۲۵
۱.۷	۱.۴۸

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی

(سیب زمینی ۵۰۶۰ هزارتن)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی

(سیب زمینی ۲۴۸ هزارتن)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

افزایش تولید سیب زمینی به میزان ۲۴۸هزارتن

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی	شاخص اندازه گیری عملکرد ۱۳۹۳	طرح افزایش تولید سیب زمینی هزار تن
	اهداف دو ساله	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴			
	۱۳۹۷	۱۳۹۵		۲۷۱	۳۱۳
	۱۳۹۸	۱۳۹۶		۲۴۸	۲۴۸
	۱۳۹۹				۲۵۲
	۱۴۰۰				۲۵۵
	۱۴۰۱				۲۵۹
	۱۴۰۲				۲۶۳
	۱۴۰۳				۲۶۷
	۱۴۰۴				۲۷۱
					۲۷۵
					۲۷۹
					۲۸۴

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال

۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳- ذینفعان پروژه:

بهره برداران کشاورزی، مصرف کنندگان (بخش مردمی اقتصاد)، ناوگان حمل و نقل، صاحبان کارخانجات صنایع تبدیلی و فرآوری محصول، اقتصاد کلان کشور (ممانعت از خروج ارز از کشور، ارتقا توان تولید)

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

تامین منابع و نیروی انسانی، ایجاد تشکل ها و شرکت های تعاونی در جهت حمایت از بهره برداران کشاورزی، تامین ناوگان حمل و نقل مناسب و کافی به خصوص زمان برداشت محصول، تامین ادوات و ماشین آلات پیشرفته، ترویج روش های نوین آبیاری در جهت کاهش مصرف آب، تامین هسته اولیه غده بذری، تأمین صنایع تبدیلی و فرآوری محصول و صنایع سردخانه‌ای و انبارهای فنی.

۵- شرح کلی پروژه:

بدنبال ارتقاء توان تولید ملی و در جهت امنیت غذایی و همچنین افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (سیب زمینی ۲۴۸ هزارتن) با احداث مزارع الگویی و آرمانی، خاکورزی حفاظتی، حاصل خیزی خاک و بهبود تغذیه گیاهی، تولید و تامین بذر، افزایش کارایی مصرف آب، افزایش ضریب و سطح مکانیزاسیون و خرید تجهیزات فنی در شهرستانهای جنوبی استان (جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبارجنوب، منوجان، قلعه گنج و فاریاب) اجرا می گردد.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

طرح استمرار از پاییز شروع و اواخر زمستان خاتمه می یابد .
طرح عادی (تولید بهاره) از اواخر پاییز و اوایل زمستان شروع
و تا اواخر بهار خاتمه می یابد . کشت تابستانه از یکم لغایت ۲۰
مرداد ماه.

ردیف	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	اطلاع رسانی به کشاورزان	آگاهی کشاورز	۹۵/۵	۹۵/۶
۲	عقد قرارداد کشت بین مراکز جهادکشاورزی و کشاورزان	فرم های قرارداد کشت (استمرار)	۹۵/۶	۹۵/۶
		فرم های قرارداد تولید بهاره)	۹۵/۹	۹۵/۱۰
۳	نظارت و مساعدت در فرایند تولید	سطح زیر کشت (استمرار)	۹۵/۷	۹۵/۹
		بهاره	۹۵/۱۰	۹۶/۲
۴	نظارت بر داشت	عملکرد بر واحد سطح	۹۵/۱۰	۹۵/۱۲
			۹۶/۰۱	۹۵/۰۳
۵	نظارت و مساعدت بر فرایند برداشت	محصول تولید شده	۹۵/۱۰	۹۵/۱۲
			۹۶/۰۱	۹۵/۰۳

۷- بودجه پروژه:

اعتبارات هزینه ای ۷۸۲۷ میلیون ریال
اعتبارات تملکی ۱۲۰۰ میلیون ریال
یارانه خرید بذر ۲۵۰۰ میلیون ریال
تسهیلات نقدینگی ۶۰۰۰۰ میلیون ریال


۸- ساختار پروژه

مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: آقای اسلام شاهرخی معاون بهبود تولیدات گیاهی زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت پیگیری در جهت تحقق عملیات اجرایی ابلاغی ستاد و رعایت الگوی کاشت و تولید و اجراء پروژه های مربوطه، نظارت بر اجرای کار، هماهنگی کلیه واحدهای مرتبط با پروژه، نظارت بر تأمین و توزیع نهاده ها، هماهنگی های بین ستاد و حوزه های اجرایی، انجام مناسب و بموقع عملیات اجرایی تولید محصول سالم و عرضه بموقع، هماهنگی جهت اطلاع رسانی و عقد قراردادهای، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

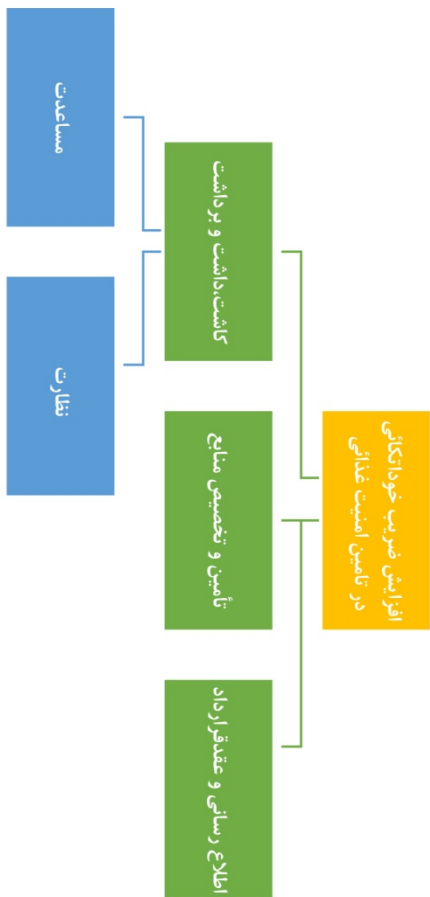

۱۰- برنامه زمانبندی

عنوان	زمان (طرح استمرار)	زمان (طرح عادی تولید بهاره)	وزن فعالیت (درصد)	توضیحات
کاشت	۱۳۹۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۹۵/۰۹/۲۰ لغایت ۹۵/۱۰/۲۰	۲۵	
داشت	۱۳۹۵/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۹۶/۱۱/۰۱ لغایت ۹۶/۱/۳۰	۵۰	
برداشت	۱۳۹۵/۱۰/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۹۶/۰۲/۱ لغایت ۹۶/۰۳/۱۰	۲۵	

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

توسعه کشت های گلخانه ای (احداث گلخانه) ۱۷۷۷ هکتار

پروژه متناظر استانی (جنوب):

توسعه کشت های گلخانه ای (احداث گلخانه) - ۱۳۰ هکتار

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۳- ذینفعان پروژه:

بهره‌برداران کشاورزی، مصرف کنندگان (بخش مردمی اقتصاد)، ناوگان حمل و نقل، اقتصاد کلان کشور (ارتقا توان تولید)

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

تخصیص اعتبارات مورد نیاز، تدوین تفاهم نامه بین سازمان‌ها، سازمان نظام مهندسی، محیط زیست و بهداشت و دسترسی به سازه گلخانه استاندارد جهت کیفیت و کمیت مطلوب.

۵- شرح کلی پروژه:

تولید محصول سالم و با کیفیت و استفاده بهینه از آب و خاک با توسعه گلخانه‌ها و اصلاح سازه‌ها سنتی و کاهش مصرف سم و کود. اختصاص تسهیلات به متقاضیان و احداث و اصلاح گلخانه در شهرستانهای (جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب). متقاضیان پس از مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و در صورت داشتن شرایط فنی و... پروانه تأسیس اخذ و به بانک معرفی می‌گردند.

پس از اخذ تسهیلات نسبت به احداث تأسیسات زیر نظر کارشناسان مربوطه اقدام و در زمان مناسب نسبت کشت محصول صورت می‌گیرد.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

توسعه گلخانه ها و اصلاح سازه از سال ۹۵ شروع و تا پایان برنامه ششم ۸۹۰ هکتار توسعه گلخانه و ۲۵۰ هکتار اصلاح سازه.

شماره	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ
۱	مطالعه و اخذ مجوزهای لازم	اخذ پروانه تأسیس	۹۵/۱ لغایت ۹۵/۱۲
۲	اختصاص تسهیلات	اخذ تسهیلات	۹۵/۳ لغایت ۹۵/۱۱
۳	اجرای سازه	تاسیسات گلخانه	۹۵/۰۳ لغایت ۹۵/۱۲
۴	بهره برداری	تولید محصول	۹۵/۸ لغایت ۹۶/۳

۷- بودجه پروژه: (سال ۹۵)

سرمایه ای ۴۱۶۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش ۱۰۴۰۰۰ میلیون ریال


۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: آقای اسلام شاهرخی معاون بهبود تولیدات گیاهی زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت اطلاع رسانی و عقد قراردادهای، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

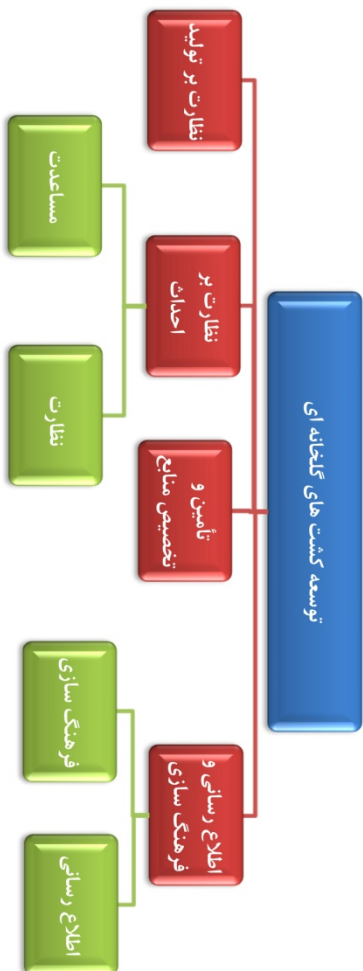

۱۰- برنامه زمانبندی:

WBS کد	۱	۲	۳	۴	۵
فعالیت	اطلاع رسانی	مراجعه به سازمان نظام مهندسی	معرفی به بانک	احداث سازه	تولید
زمان آغاز	۹۵/۱	۹۵/۳/۱۷	۹۵/۳/۱۸	۹۵/۳/۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۵
زمان پایان	۹۵/۱۲	۹۵/۳/۲۷	۹۵/۰۴/۱۷	۹۵/۰۶/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
پیش نیاز	-	مدرک آب و زمین	تخصیص تسهیلات	دریافت تسهیلات	احداث سازه
مسئول	روابط عمومی				
خروجی ملموس	آگاهی متقاضیان	پروانه	اخذ تسهیلات	سازه	محصول تولید شده
وزن فعالیت	۵	۵	۲۵	۴۰	۲۵
هزینه (میلیارد ریال)	-	-	۳۱۲	۱۷	۱۴۸

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی

پروژه متناظر استانی (جنوب):

تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی

(سم - نظارت بر آفت کش ها در عرصه)

مدیر پروژه:

آقای سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

پوشش سطح مورد نظر سالانه در خصوص تأمین سموم از سال ۹۵ شامل ۱۷۰۰۰ هکتار تا افق ۱۴۰۴ شامل ۴۰۰۰۰ هکتار

شرح هدف کمی	شاخص اندازه گیری	عملکرد ۱۳۹۳	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	اهداف ۵ ساله					اهداف در افق چشم انداز
				اهداف دو ساله	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
تولیدات آفت کش غیر شیمیایی	هزار هکتار	۱۵	۱۷	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۵	۲۷
									۲۸
									۲۹
									۳۱

* فراهم سازی زمینه توسعه و تولید انبوه انواع آفتکش غیر شیمیایی

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال ۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳- ذینفعان پروژه:

بهره برداران بخش کشاورزی، مصرف کنندگان، حمل و نقل، کارشناسان بخش کشاورزی و بطور کلی اقتصادمندی از سلامت محصول منتفع خواهد شد.

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

تأمین منابع مالی (دولتی و تسهیلات بانکی)
توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی

۵- شرح کلی پروژه:

انجام عملیات سمپاشی در کانون آفت ملخ صحرایی منطقه (جازموریان) و کانون کوبی آفت مزبور- انجام عملیات مبارزه شیمیایی علیه آفت پسیل مرکبات با توجه به نقش آفت در انتقال بیماری گرینینگ مرکبات- انجام عملیات پروپ برداری و مبارزه علیه موش و جلوگیری از خسارت این آفت.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

ردیف	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	نظارت برانجام عملیات سالانه علیه ملخ صحرایی	کاهش تعداد ملخ صحرایی	۹۵/۳	۹۵/۱۲
۲	نظارت برانجام عملیات سالانه علیه پسیل مرکبات	کاهش آفت مرکبات	۹۵/۶	۹۵/۸
۳	نظارت برانجام عملیات مبارزه با موش در تمام فصول سال	کاهش تعداد موش	۹۵/۳	۹۵/۱۲

۷- بودجه پروژه: (سال ۹۵)

اعتبار دولتی	۹۰۰۰ میلیون ریال
تسهیلات بانکی	۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه


مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد

مدیر زیر پروژه: آقای اسلام شاهرخی معاون بهبود تولیدات گیاهی

وظایف و اختیارات: مبارزه بموقع، انجام عملیات پیش آگاهی، تأمین سموم مورد نیاز، ردیابی و پایش از طریق دیده بانهای محلی در ارتباط با ملخ صحرائی، ردیابی و پایش از طریق کارشناسان منطقه در ارتباط با ملخ صحرائی، موش، پسیل مرکبات

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

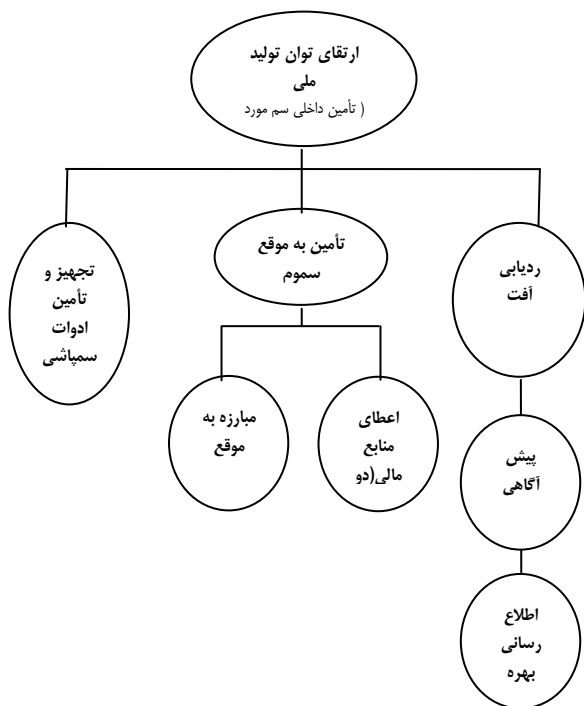

۱۰- برنامه زمانبندی

WBSS کد	۱	۲	۳	۴
فعالیت	ردیابی آفت ملخ صحرائی	مبارزه با آفت ملخ	ردیابی و مبارزه علیه پسیل مرکبات	مبارزه علیه آفت موش
زمان آغاز	۹۵/۱۱/۱۵	۹۶/۱/۱۵	۹۵/۷/۱ ۹۵/۱۱/۱۵	۹۵/۳/۱۵
زمان پایان	۹۶/۱/۰۱	۹۶/۰۲/۳۰	۹۵/۸/۳۰ ۹۵/۱۲/۱۵	۹۵/۱۲/۲۰
پیش نیاز	تأمین اعتبار	تأمین اعتبار	تأمین اعتبار	تأمین اعتبار
مسئول	بخش دولتی و خصوصی	بخش دولتی و خصوصی	بخش دولتی و خصوصی	بخش دولتی و خصوصی
خروجی ملموس	تعیین زمان دقیق مبارزه	جلوگیری از خسارت آفت	جلوگیری از خسارت آفت	جلوگیری از خسارت آفت
وزن فعالیت	۵	۵	۲۵	۴۰

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای بهره وری

پروژه ملی :

توسعه سامانه های نوین آبیاری (۲۵۰ هزار هکتار)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

توسعه سامانه های نوین آبیاری (۹۰۵۸ هکتار)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای بهره وری آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با تجهیز ۹۰۵۸ هکتار از اراضی زیرکشت به سامانه های نوین آبیاری

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

شماره	۱
عنوان هدف	آبیاری
فرمول محاسبه	(هکتار)
۹۳	۴۱۹۰
۹۴	۹۲۱ههبرآورد
۹۵	۹۰۵۸
۹۶	۹۰۵۸
۹۷	۹۰۵۸
۹۸	۹۰۵۸
۹۹	۹۰۵۸
۱۴۰۴	۱۳۴۰۲
مرجع آماری	سند ملی آب
توضیحات	

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال ۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳-ذینفعان پروژه:

کشاورزان و بهره برداران.

۴-پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- مطالعات جامع پروژه
- تامین منابع مالی
- اسناد آب و زمین .

۵- شرح کلی پروژه:

انواع پروژه های آبیاری تحت فشار بصورت انفرادی یا تجمیعی در شهرستانهای منطقه (جیرفت، کهنوج، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب) با مدیریت و نظارت اداره کل جهادکشاورزی جنوب استان و با همکاری و همراهی صاحبان اراضی کشاورزی اجرا می گردد..

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

*زمانبندی پروژهها بر اساس میزان سطح و اعتبار پروژه متفاوت می باشد. و جز پروژه های کوتاه مدت محسوب می شود.

شماره	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ
۱	مطالعه و طراحی	تهیه طرح جامع قابل اجرا	۹۵/۱ لغایت ۹۵/۱۲
۲	اجرا و نظارت	آماده شدن طرح برای بهره برداری	۹۵/۰۱ لغایت ۹۵/۱۲
۳	بهره برداری	تولید با سامانه نوین آبیاری	۹۵/۰۱ لغایت ۹۵/۱۲

حجم عملیات اجرایی در سه ماهه اول سال برابر ۱۰ درصد کل عملیات اجرایی، سه ماهه دوم برابر ۲۰ درصد، سه ماهه سوم برابر ۵۰ درصد و سه ماهه چهارم سال برابر ۲۰ درصد خواهد بود.

۷- بودجه پروژه: اعتبار دولتی

منبع تامین اعتبار	سال (میلیون ریال)						عنوان طرح
	۱۴۰۴	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	
ملی	۷۵۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	۶۷۹۳۵۰	توسعه سامانه های نوین آبیاری


۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سید یعقوب موسوی مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان
وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: آقای وحدت برخورداري معاون آب و خاک زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت اطلاع رسانی و عقد قراردادهای، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد.

ساختار پروژه	اختیارات و وظایف
کارفرما	نظارت بر کلیه عوامل موجود در طرح بر اساس استانداردهای بین المللی نظارت
دستگاه نظارت	شامل نظارت کارگاهی و عالییه بازنگری مطالعات گذشته نظارت بر اجرا و بهره برداری
پیمانکار	شرکت حقوقی بخش خصوصی که اجرای پروژه بر اساس برنامه زمان بندی و دستورات دستگاه نظارت
بهره بردار	عمل به دستورالعمل های صادره جهت استفاده در زیرساخت های ایجادشده

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

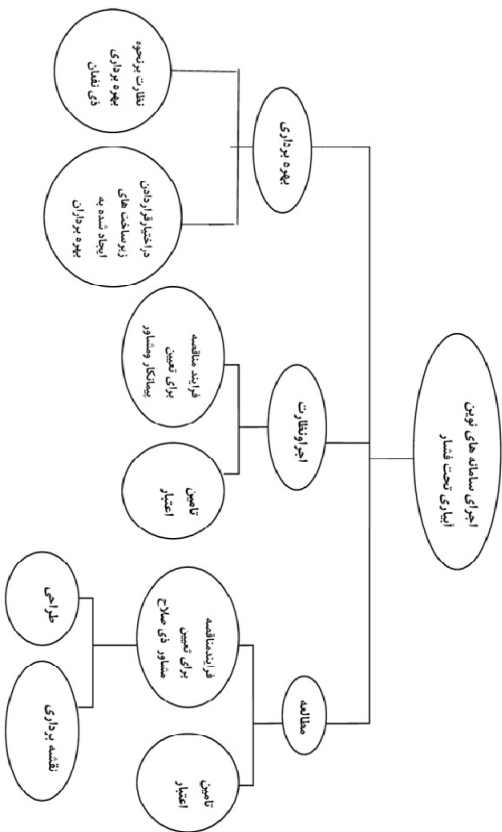

۱۰- برنامه زمانبندی:

کد	فعالیت/ بسته کاری	زمان آغاز	زمان پایان	خروجی ملموس	مسئول	هزینه
۱	فاز اول (طراحی)	۹۵/۱		تهیه مطالعات	معاون آب و خاک	۲۱۰۰۰۰۰
۱-۱	فعالیت ۱ (تامین اعتبار)	۹۵/۱				
۲-۱	فعالیت ۲ (فرایند مناقصه)	۹۵/۱				
-۱ ۱-۲	فعالیت ۳ (نقشه برداری)	۹۵/۱		تهیه نقشه		۸۰۰۰۰۰
-۱ ۲-۲	فعالیت ۴ (طراحی)	۹۵/۱		تهیه طرح		۱۳۰۰۰۰۰
۲	فاز دوم (اجرا و نظارت)	۹۵/۱		طرح های اجرا شده		۷۳۰۰۰۰۰۰
۳	فاز سوم (بهره برداری)	۹۵/۱				۱۴۰۰۰۰۰۰

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی (۱۵۰ هزار هکتار)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (۴۰۰۰ هکتار)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی(درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

شماره	عنوان هدف	فرمول محاسبه
۱	احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی	هکتار
۲		۷۴
۳		۱۷۶
۴		۴۰۰۰
۵		۸۹۸۵
۶		۳۶۰۰
۷		۳۲۰۰
۸		۲۷۹۱
۹		
	مرجع آماری	سند ملی آب
	توضیحات	

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال ۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳-ذینفعان پروژه:

کشاورزان و بهره برداران. با توجه به اثرات صرفه جوئی و ارتقای بهره وری منافع ملی بدنبال خواهد داشت.

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- مطالعات جامع پروژه
- تامین منابع مالی
- اسناد آب و زمین .

۵- شرح کلی پروژه:

احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی درواقع، تکمیل مجموعه سرمایه گذاری های انجام شده درزمینه تامین آب ازطریق احداث سدها و شبکه های اصلی و فرعی آبیاری وزهکشی بوده ودرراستای انتقال آب ازمنابع تامین شده به مزارع کشاورزی جهت بهره وری بیشتر ازمنابع آب موردنظرقراری گیرد.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

شماره	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ
۱	مطالعه و طراحی	تهیه طرح جامع قابل اجرا، تدوین الگوی کاشت	۹۵/۱ لغایت ۹۵/۱۲
۲	اجرا و نظارت	آماده شدن طرح برای بهره برداری، تطبیق نقشه های آماده شده با کارهای در دست اقدام	۹۵/۴ لغایت ۹۵/۱۲
۳	بهره برداری	مصرف بهینه آب	۹۵/۴ لغایت ۹۵/۱۲

حجم عملیات اجرایی در سه ماهه اول سال برابر ۱۰ درصد کل عملیات اجرایی، سه ماهه دوم برابر ۲۰ درصد، سه ماهه سوم برابر ۵۰ درصد و سه ماهه چهارم سال برابر ۲۰ درصد خواهد بود.

۷- بودجه پروژه:

اعتبار دولتی:

عنوان طرح	سال (میلیون ریال)					احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری وزشکشی
	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	
منبع تامین اعتبار						
	۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	
						۶۰۰۰۰۰
						ملی

۸- ساختار پروژه:


مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: آقای وحدت برخوردارى معاون آب و خاک زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت اطلاع رسانی و عقد قراردادهای، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد.

ساختار پروژه	کارفرما	دستگاه نظارت	پیمانکار	بهره بردار
اختیارات ووظایف	نظارت بر کلیه عوامل موجود در طرح براساس استانداردهای بین المللی	شامل نظارت کارگاهی وعالیه بازنگری مطالعات گذشته نظارت بر اجرا و بهره برداری	شرکت حقوقی بخش خصوصی که اجرای پروژه براساس برنامه زمان بندی و دستورات دستگاه نظارت	عمل به دستورالعمل های صادره جهت استفاده در زیرساخت های ایجادشده

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

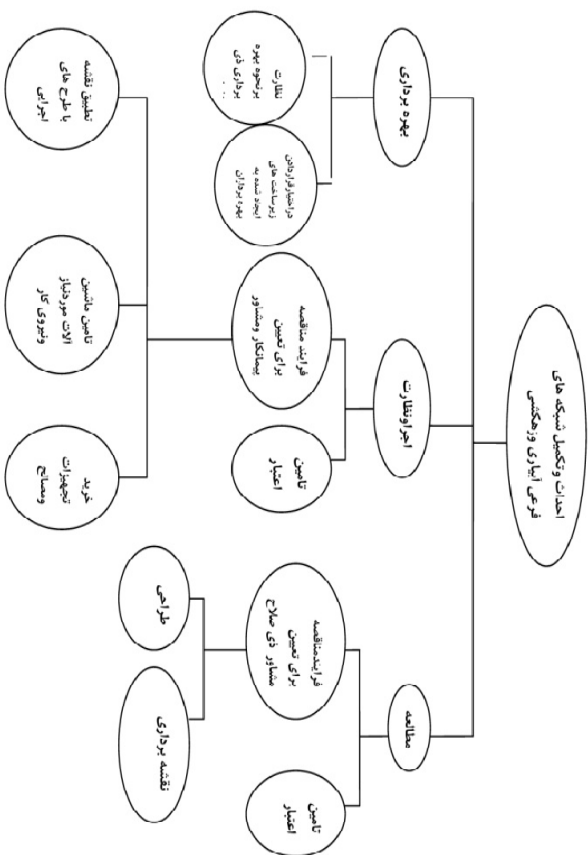

۱۰- برنامه زمانبندی:
هزینه به میلیون ریال

کد	فعالیت/بسته کاری	زمان آغاز	زمان پایان	خروجی ملموس	مسئول	هزینه
۱	فازاول (طراحی)	۹۵/۱	۹۵/۱۲	تهیه مطالعات	معاون آب و خاک	۲۱۰۰۰۰۰
۱-۱	فعالیت ۱ (تامین اعتبار)	۹۵/۱				
۲-۱	فعالیت ۲ (فرایند مناقصه)	۹۵/۱				
۱-۲-۱	فعالیت ۳ (نقشه برداری)	۹۵/۱		تهیه نقشه		۸۰۰۰۰۰
۲-۲-۱	فعالیت ۴ (طراحی)	۹۵/۱		تهیه طرح		۱۳۰۰۰۰۰
۲	فازدوم (اجرا و نظارت)	۹۵/۱	۹۵/۱۲	طرح های اجرا شده		۷۳۰۰۰۰۰
۳	فاز سوم (بهره برداری)	۹۵/۱	۹۵/۱۲			۱۴۰۰۰۰۰

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

افزایش فرآورده‌ها و کاهش ضایعات در تولید محصولات کشاورزی

پروژه متناظر استانی (جنوب):

افزایش فرآورده‌ها و کاهش ضایعات در تولید محصولات کشاورزی

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

جذب مواد خام کشاورزی (۱۱۸ هزار تن)

کاهش ضایعات از طریق فرآوری (۱۲ هزار تن)

اهداف کمی جنوب کرمان در افزایش فرآوردها و کاهش

ضایعات کشاورزی

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی	ضایعات کشاورزی
	اهداف دو ساله	اهداف دو ساله		
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	هزار تن
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۳	۸۴
	۱۳۹۹	۱۴۰۰		۱۱۸
	۱۴۰۱	۱۴۰۲		۸۹
	۱۴۰۳	۱۴۰۴		۸۳
	۱۴۰۴			۱۰۵
				۹۶
				۱۸۰
				۱۲۶
				۱۱۵
				۱۴۰
				۱۲۵

میزان کاهش ضایعات	بازسازی و نوسازی واحدها	میزان اشتغال در برنامه
هزار تن	واحد کارگاهی	نفر
۱۲	۲	۴۸۰
۹	۲	۳۷۵
۸	۴	۳۹۷
۱۰	۵	۵۱۲
۹	۶	۴۸۸
۱۸	۶	۵۱۸
۱۳	۷	۴۰۵
۱۱	۷	۴۲۹
۱۴	۷	۵۵۳
۱۲	۸	۵۲۷

۳-ذینفعان پروژه:

- ۱- کشاورزان: باعث ارزش افزوده محصولات کشاورزی و افزایش درآمد آن ها می شود و از ضایعات جلوگیری می کند.
- ۲- فعالان اقتصادی: باعث رونق اقتصادی و افزایش درآمد فعالان اقتصادی می شود.
- ۳- سرمایه گذاران خارجی: در صورت سرمایه گذاری با توجه به اختلاف قیمت محصولات در منطقه با کشورهای هدف سودآوری بالایی برای سرمایه گذاران خواهد داشت.

۴- اقتصاد کلان کشور: با افزایش ارزش افزوده محصولات و همچنین صادرات محصولات امکان بهره مندی و سودآور بودن اقتصاد کلان میسر می گردد.

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

اعتبارات و تسهیلات کم بهره بانکی

تأمین ماشین آلات مورد نیاز

۵- شرح کلی پروژه:

نظر به این که در منطقه جنوب کرمان بالغ بر ۴ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود و مقدار اندکی از آن نگهداری و فرآوری می گردد، لذا نیاز به فرآوری ۱۱۸ هزار تن محصولات خام کشاورزی در سال ۹۵ وجود دارد که می تواند با اعطای تسهیلات به مرحله عمل و انجام برسد

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

پروژه های صنایع در زمان های یکساله، دوساله، پنج ساله و ده ساله تهیه و تنظیم گردیده است..

۷- بودجه پروژه:


تسهیلات بانکی ۱۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سید یعقوب موسوی مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان
وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را بر عهده دارد. راهبری جهت اخذ مجوزهای لازم توسط

متقاضیان با معرفی به سیستم بانکی و راه اندازی واحدهای مربوطه.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

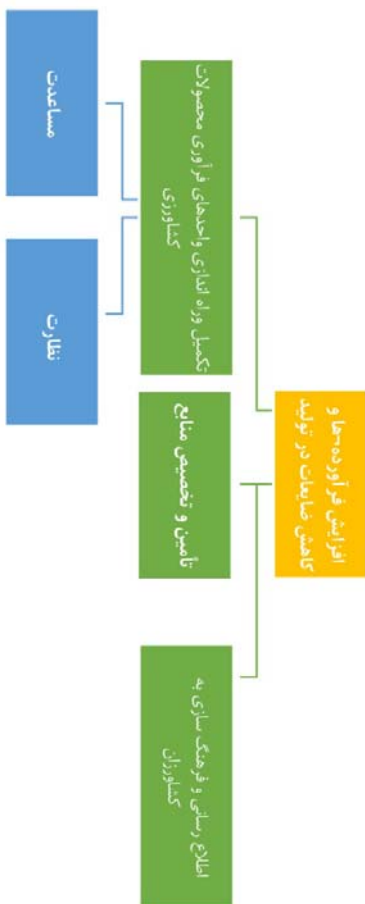

۱۰- برنامه زمانبندی:

کد WBS	۱	۲	۳
فعالیت	اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به کشاورزان	تامین و تخصیص منابع	تکمیل و راه اندازی واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی
زمان آغاز	۹۵/۱	۹۵/۳	۹۵/۱
زمان پایان	۹۵/۱۲	۹۵/۶	۹۵/۱۲
پیش نیاز			تامین سرمایه در گردش
مسئول	روابط عمومی		
خروجی ملموس	آگاهی کشاورزان		محصول تولید شده
وزن فعالیت	۲۰	۳۰	۵۰

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

تامین داخلی نهال اصلاح شده مورد نیاز (۱۸۶ میلیون اصله)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

تامین داخلی نهال اصلاح شده مورد نیاز (۲۲۲۸۰۱ اصله)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

تولید نهال اصلاح شده به میزان ۲۲۲۸۰۱ اصله
اهداف کمی جنوب کرمان در تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز (نهال اصلاح شده)

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی شاخص اندازه گیری عملکرد ۱۳۹۳ برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	نهال اصلاح شده
	اهداف دو ساله	اهداف دو ساله		
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۵۰۰۰۰	نهال
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۲۲۲۸۰۱	
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۲۷۸۵۰۱	
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳۱۵۶۳۵	
	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۳۵۲۷۶۸	
			۳۸۹۹۰۲	
			۴۴۷۹۸۳	
			۴۶۴۱۶۸	
			۴۸۳۷۳۵	
			۴۹۱۲۵۲	

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال ۱۳۹۵ تعریف شده است.

اهداف کمی جنوب کرمان در تأمین داخلی نهاده های
مورد نیاز (افزایش تولید محصولات)

شرح هدف کمی	اهداف ۵ ساله		افزایش تولید محصولات باغبانی
	شاخص اندازه گیری	اهداف دو ساله	
هکتار	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۰۷۶
	۱۳۹۷		۱۳۴۵
	۱۳۹۸		۱۵۲۵
	۱۳۹۹		۱۷۰۴
	۱۴۰۰		۱۸۸۴
اهداف در افق چشم انداز	۱۴۰۱		۲۰۶۳
	۱۴۰۲		۲۲۴۲
	۱۴۰۳		۲۳۳۲
	۱۴۰۴		۲۵۱۲

۳- ذینفعان پروژه:

تولیدکنندگان نهال- گلخانه داران و باغداران . بهره برداران کشاورزی، اقتصاد کلان کشور(ممانعت از خروج ارز از کشور، ارتقا توان تولید)

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

توسعه کشت های گلخانه ای جهت ایجاد تقاضا ، توسعه اصلاح و بهسازی باغات، دسترسی به منابع سالم گیاهان جهت تولید نهال سالم، تأمین منابع مالی مورد نیاز، تامین منابع و نیروی انسانی، ایجاد تشکل ها و شرکت های تعاونی در جهت حمایت از بهره برداران کشاورزی.

۵- شرح کلی پروژه:

تولید نهال عاری از بیماری و گواهی شده و توزیع بین باغداران شهرستانهای(جیرفت، کهنوج، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب)، همچنین احیا، اصلاح و بهسازی باغات و توسعه کشت های گلخانه ای، افزایش عملکرد و کیفیت میوه و در نتیجه افزایش درآمد باغداران، تنوع و برخورداری از ارقام تجاری مطلوب و بالقوه بازارپسند ، ساماندهی متقاضیان توانمند بخش خصوصی براساس ضوابط تولید نهال

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:
تولید نشاء محصولات گلخانه ای

ردیف	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	نظارت بر تهیه بذور سالم و پربازده	بذر سالم و فاقد آفت	۹۵/۳	۹۵/۵
۲	نظارت بر آماده سازی گلدان جهت کشت		۹۵/۵	۹۵/۶
۳	نظارت بر کاشت بذور		۹۵/۶	۹۵/۷
۴	نظارت بر انتقال نهال ها به زمین		۹۵/۶	۹۵/۸
۵	نظارت بر برداشت نهال های کاشته شده		۹۶/۱۰	۹۷/۶

تولید نهال مرکبات

تاریخ پایان	تاریخ شروع	خروجی ملموس	عنوان فاز	ردیف
۹۵/۶	۹۵/۵	بذر سالم و فاقد آفت	تهیه بذر سالم و پربازده	۱
۹۵/۶	۹۵/۵		نظارت بر آماده سازی گلدان جهت کشت	۲
۹۶/۱۰	۹۵/۱۱	بذور	نظارت بر کاشت بذور	۲
۹۷/۶	۹۶/۱۰		نظارت بر انتقال نهال های نرک از خزانه بذری به انتظار	۳
۹۸/۶	۹۷/۶	عملکرد بر واحد سطح	نظارت بر پیوند نهال ها	۴
۹۸/۱۱	۹۸/۶	محصول تولید شده	نظارت و مساعدت بر فرایند فروش نهال ها	۵

۷- بودجه پروژه: (تولید نهال اصلاح شده مرکبات)

اعتبار دولتی : ۱۷۸۲ میلیون ریال

تسهیلات بانکی : ۷۱۳۰ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی

جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن

انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: آقای مهندس اسلام شاهرخی معاون تولیدات

گیاهی.

زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت

جهاد کشاورزی مسئولیت پیگیری در جهت تحقق عملیات اجرایی

ابلاغی ستاد و رعایت الگوی کاشت و تولید و اجراء پروژه های

مربوطه، نظارت بر اجرای کار، هماهنگی کلیه واحدهای مرتبط با

پروژه، نظارت بر تأمین و توزیع نهاده ها، هماهنگی های بین ستاد و


حوزه های اجرایی، انجام مناسب و بموقع عملیات اجرایی تولید

محصول سالم و عرضه بموقع، هماهنگی جهت اطلاع رسانی و

عقد قراردادهای، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر

اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

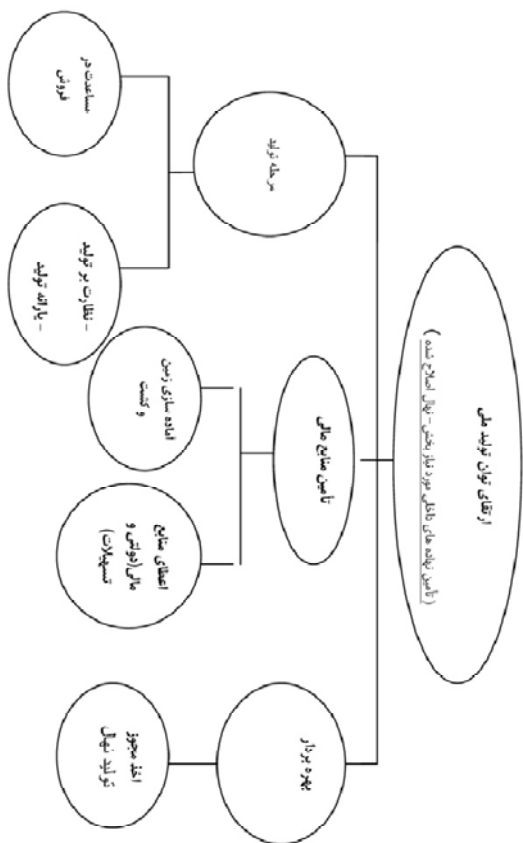

۱۰- برنامه زمانبندی

وزن فعالیت(درصد)	زمان	زیر فعالیت	عنوان
۵۰	۹۵/۳	تهیه بذور سالم	تولید
	۹۵/۶	کاشت بذور	نشاء
	۱۰	برداشت نهال های	محصولات
	۹۵	کاشته شده	گلخانه ای
۵۰	۹۵/۳	تهیه بذور سالم	تولید نهال مرکبات
	۹۵/۶	کاشت بذور	
	۹۶/۱۰	انتقال نهال های نرک از خزانه بذری به انتظار	
	۹۷/۶	پیوند نهال ها	
	۹۸/۶	فروش نهال ها	

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید تخم مرغ ۹۵۱ هزار تن)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید تخم مرغ ۱.۶ هزار تن)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی(درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تأمین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

تولید ۱.۶ هزار تن تخم مرغ
اهداف کمی جنوب کرمان در خوداتکایی تولید تخم

مرغ

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی	شاخص اندازه گیری	عملکرد ۱۳۹۳	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	تخم مرغ
	اهداف دو ساله	اهداف یک ساله					
		۱۳۹۵	۱۳۹۶				هزار تن
		۱۳۹۷					۱.۴
		۱۳۹۸					۱.۵
		۱۳۹۹					۱.۷
		۱۴۰۰					۱.۷
		۱۴۰۱					۱.۸
		۱۴۰۲					۱.۹
		۱۴۰۳					۱.۹
		۱۴۰۴					۲
							۲.۱
							۲.۲
							۲.۳

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال

۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳- ذینفعان پروژه:

بهره برداران، کشاورزان، کارخانه های خوراک دام و طیور، حمل و نقل و مصرف کنندگان (بخش مردمی اقتصاد)...

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- تخصیص تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش کم بهره
- رفع ممنوعیت صدور مجوز مرغ تخم گذار

۵- شرح کلی پروژه:

بدنبال ارتقاء توان تولید ملی و در جهت امنیت غذایی و همچنین افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی افزایش تولید تخم مرغ به ۱.۶ هزار تن در سال ۹۵ خواهد رسید

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

تمام طول سال

۷- بودجه پروژه:


اعتبارات دولتی ۲۸ میلیون ریال
تسهیلات بانکی ۳۰۰۰۰ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان
وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.
مدیر زیر پروژه : جهانگیر مشایخی معاون بهبود تولیدات دامی

معاونت بهبود تولیدات دامی بر اساس سیاست های ابلاغی وزارتخانه در خصوص عملیتهای اصلاح نژادی، تغذیه و جایگاه دام و... در جهت نیل به اهداف افزایش تولیدات دامی - جوجه ریزی، نظارت بر تولید تخم و مرغ و... اقدام می نماید.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

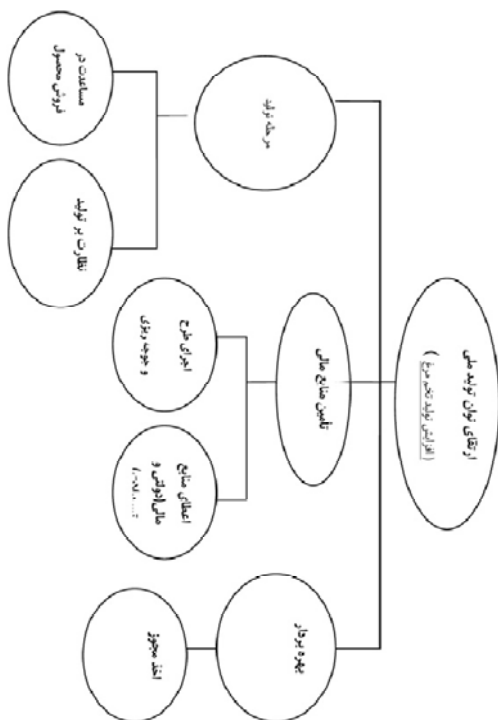

۱۰- برنامه زمانبندی:

زمانبندی تولید تخم مرغ

وزن فعالیت (درصد)	پایان	شروع	شرح
۱۰	۹۵/۱/۱۵	۹۵/۱/۱	آماده سازی سالن و تهیه جوجه
۷۰	۹۷/۰۴/۱۶	۹۵/۱/۱۶	جوجه ریزی و تولید تخم مرغ
۲۰	۹۷/۰۴/۱۶	۹۵/۱/۱	نظارت بر تولید و بهبود مدیریت واحدهای مرغداری

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید گوشت مرغ
۲۱۷۹ هزارتن)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید گوشت مرغ
۱.۷ هزار تن)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی
مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

تولید ۱.۷ هزار تن گوشت مرغ .

اهداف کمی جنوب کرمان در خوداتکایی تولید گوشت

مرغ

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی شاخص اندازه گیری عملکرد ۱۳۹۳ عملکرد ۱۳۹۴ برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	گوشت مرغ هزار تن
	اهداف دو ساله	اهداف دو ساله		
	۱۳۹۷	۱۳۹۵	۱.۷	۱.۵
	۱۳۹۸	۱۳۹۶	۱.۷	۱.۵
	۱۳۹۹		۱.۷	۱.۵
	۱۴۰۰		۱.۷	۱.۵
	۱۴۰۱		۱.۷	۱.۵
	۱۴۰۲		۱.۷	۱.۵
	۱۴۰۳		۱.۷	۱.۵
	۱۴۰۴		۱.۷	۱.۵

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال

۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳- ذینفعان پروژه:

اقتصاد ملی، مرغداران، کشاورزان، کارخانه های خوراک دام و مصرف کنندگان (بخش مردمی اقتصاد)...

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- تخصیص تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش کم بهره.
- رفع ممنوعیت صدور مجوز مرغداری و سایر ماکیان .

۵- شرح کلی پروژه:

بدنبال ارتقاء توان تولید ملی و در جهت امنیت غذایی و همچنین افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی افزایش تولید گوشت مرغ از مقدار ۱.۳ هزار تن در سال ۹۴ به میزان ۱.۷ هزار تن در سال ۹۵ انجام می گیرد

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

تمام طول سال انجام می شود.

۷- بودجه پروژه:


اعتبارات دولتی	۶۷۷۰۰ میلیون ریال
تسهیلات بانکی	۴۶۰ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان
وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.
مدیر زیر پروژه : جهانگیر مشایخی معاون بهبود تولیدات دامی

معاونت بهبود تولیدات دامی بر اساس سیاست های ابلاغی وزارتخانه در خصوص عملیاتیهای اصلاح نژادی، تغذیه و جایگاه دام و... در جهت نیل به اهداف افزایش تولیدات دامی و نظارت بر جوجه ریزی واحدهای مرغداری براساس پروانه مرغداری، نظارت بر تولید، نظارت بر فروش اقدام می نماید.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

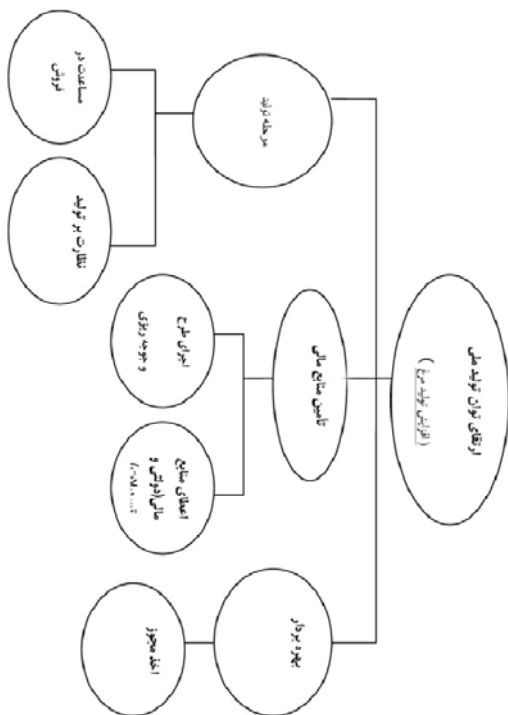

۱۰- برنامه زمانبندی:

برنامه زمانبندی تولید گوشت مرغ

شرح	آماده سازی سالن	تولید گوشت	(تهیه) مدیریت واحدهای
دوره اول	شروع	۹۵/۱/۱	۹۵/۱۲/۳۹ - ۹۵/۱/۱
	پایان	۹۵/۱/۷	
دوره دوم	شروع	۹۵/۲/۳۱	
	پایان	۹۵/۳/۶	
دوره سوم	شروع	۹۵/۴/۳۱	
	پایان	۹۵/۵/۶	
دوره چهارم	شروع	۹۵/۶/۲۹	
	پایان	۹۵/۷/۵	
دوره پنجم	شروع	۹۵/۸/۲۹	
	پایان	۹۵/۹/۵	
دوره ششم	شروع	۹۵/۱۰/۲۹	
	پایان	۹۵/۱۱/۵	
وزن فعالیت (درصد)		۵	۸۰
			۱۵

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید گوشت قرمز
۸۱۹ هزار تن)

پروژه متناظر استانی (جنوب):

افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی (تولید گوشت قرمز
۱۱.۸۷ هزار تن)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱-هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولید ملی(درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲-اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

تولید ۱۱/۸۷ هزار تن گوشت قرمز.

اهداف کمی جنوب کرمان در خوداتکایی تولید گوشت

قرمز

اهداف در افق چشم انداز	اهداف ۵ ساله		شرح هدف کمی	شاخص اندازه گیری	عملکرد ۱۳۹۳	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	گوشت قرمز
	اهداف دو ساله	اهداف					
		۱۳۹۵	۱۳۹۶			۱۱.۸۷	
		۱۳۹۷				۱۱.۸۲	
		۱۳۹۸				۱۱.۹۳	
		۱۳۹۹				۱۲	
		۱۴۰۰				۱۲.۱۸	
		۱۴۰۱				۱۲.۴۷	
		۱۴۰۲				۱۲.۸۷	
		۱۴۰۳				۱۳.۲۷	
		۱۴۰۴				۱۳.۷۱	
						۱۴.۱۸	

*منشور پروژه ی تنظیم شده تنها در جهت تحقق هدف سال

۱۳۹۵ تعریف شده است.

۳- ذینفعان پروژه:

بهره برداران بخش کشاورزی، و مصرف کنندگان (بخش مردمی اقتصاد)...

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- تخصیص تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش
- تعیین قیمت خرید شیرخام براساس قیمت تمام شده.

۵- شرح کلی پروژه:

بدنبال ارتقاء توان تولیدملی و در جهت امنیت غذایی و همچنین افزایش ضریب خوداتکائی محصولات اساسی افزایش تولید گوشت قرمز از مقدار ۱۱/۸۲ هزار تن در سال ۹۴ به میزان ۱۱/۸۷ هزار تن در سال ۹۵.

افزایش تولید با انجام فعالیت های اصلاح نژادی، بهداشتی و... انجام می پذیرد

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی:

با توجه به اینکه تولید گوشت قرمز فعالیت مستمری می باشد در تمام طول سال واحدهای تولید کننده گوشت قرمز فعال می باشند.

۷- بودجه پروژه:

بودجه اعتبارات دولتی ۳۷۴۸۰ (میلیون ریال)
تسهیلات بانکی سرمایه ای ۱۴۳۱۰۰ میلیون ریال


۸- ساختار پروژه:

مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهادکشاورزی جنوب استان

وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه : جهانگیر مشایخی معاون بهبود تولیدات دامی معاونت بهبود تولیدات دامی بر اساس سیاست های ابلاغی وزارتخانه در خصوص عملیاتهای اصلاح نژادی، تغذیه و جایگاه دام و... و توزیع بین شهرستانهای جیرفت، کهنوج، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در جهت نیل به اهداف افزایش تولیدات دامی اقدام می نماید.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

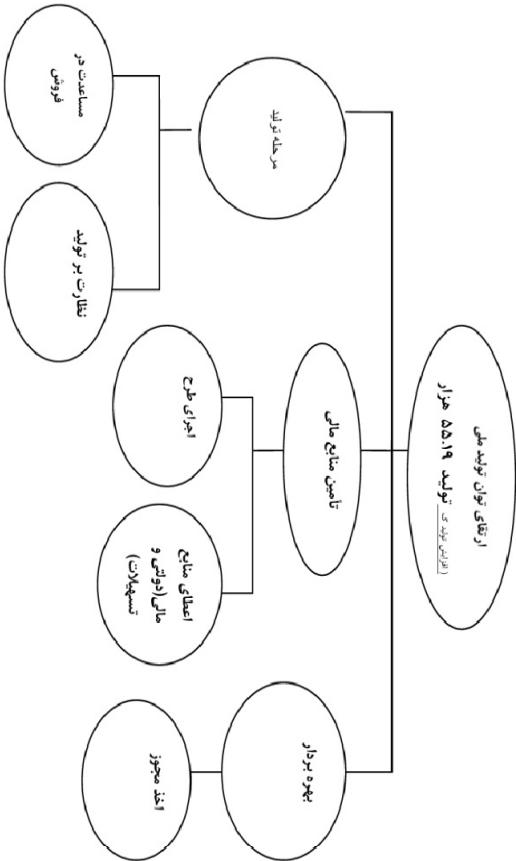

۱۰- برنامه زمانبندی:

زمانبندی تولید گوشت قرمز

شرح	بروار گوساله و تولید گوشت قرمز		بروار دام سبک و تولید گوشت قرمز		نظارت بر بهبود و افزایش تولید گوشت قرمز
	شروع	پایان	شروع	پایان	
دوره اول	شروع	۹۵/۱/۱	۹۵/۱		۹۵/۱۲/۲۹ - ۹۵/۱/۱
	پایان	۹۵/۶/۳۰	۹۵/۳		
دوره دوم	شروع	۹۵/۷/۱	۹۵/۴		
	پایان	۹۵/۱۲/۲۹	۹۵/۶		
	شروع		۹۵/۷		
دوره سوم	پایان		۹۵/۹		
	شروع		۹۵/۱۰		
دوره چهارم	پایان		۹۵/۱۲/۲۹		
	وزن فعالیت(درصد)	۸۵			۱۵

منشور پروژه
(Project Charter)

برنامه ملی :

ارتقای توان تولید ملی (درونزائی اقتصاد)

پروژه ملی :

طرح افزایش ضریب خوداتکایی روغن زیتون

پروژه متناظر استانی (جنوب):

طرح افزایش ضریب خوداتکایی روغن زیتون (تولید ۲۵۵ تن)

مدیر پروژه:

دکتر سید یعقوب موسوی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

۱- هدف کلان پروژه:

ارتقای توان تولیدملی (درونزائی اقتصاد) از طریق افزایش ضریب خوداتکائی در تامین امنیت غذائی

۲- اهداف قابل اندازه گیری پروژه:

اهداف کمی افزایش ضریب خوداتکالی روغن زیتون - جنوب

کرمان

شرح هدف کمی	تولید روغن زیتون	اصلاح باغات زیتون	توسعه باغات زیتون	اهداف ۵ ساله		اهداف در افق چشم انداز
				اهداف دو ساله	اهداف دو ساله	
شاخص اندازه گیری عملکرد ۱۳۹۳	تن	هکتار	هکتار	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۴۰۴
				برآورد عملکرد سال ۱۳۹۴	۱۰۹	۷۰
۱۳۹۷	۱۱۲	۱۱۰	۲۰	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۴۰۴
				۱۱۰.۵	۸۰	۲۰
۱۳۹۸	۱۱۳	۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۲	۱۱۰	۲۰
۱۳۹۹	۱۱۴	۱۵۰	۲۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۲	۱۱۰	۲۰
۱۴۰۰	۱۱۶	۱۴۰	۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۰.۵	۸۰	۲۰
۱۴۰۱	۱۱۸	۱۷۰	۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۲	۱۱۰	۲۰
۱۴۰۲	۱۲۰	۲۰۰	۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۰.۵	۸۰	۲۰
۱۴۰۳	۱۲۲	۲۱۰	۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۲	۱۱۰	۲۰
۱۴۰۴	۱۲۵	۲۱۵	۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴
				۱۱۰.۵	۸۰	۲۰

اهداف کمی افزایش ضریب خوداتکالی روغن از طریق تولید
زیتون - جنوب کرمان(تن)

سال ۹۵	تولید کل میوه	۲۴۲۷
	تولید زیتون کنسروی	۱۶۹۹
	روغن زیتون	۱۰۹
سال ۹۶	تولید کل میوه	۲۴۵۷
	تولید زیتون کنسروی	۱۷۲۰
	روغن زیتون	۱۱۰.۵
سال ۹۷	تولید کل میوه	۲۴۸۷
	تولید زیتون کنسروی	۱۷۴۱
	روغن زیتون	۱۱۲
سال ۹۸	تولید کل میوه	۲۵۱۷
	تولید زیتون کنسروی	۱۷۶۲
	روغن زیتون	۱۱۳
سال ۹۹	تولید کل میوه	۲۵۴۷
	تولید زیتون کنسروی	۱۷۸۲
	روغن زیتون	۱۱۴.۶

نهال زیتون در اراضی دیم - آبی در طی برنامه اقتصاد
مقاومتی- جنوب کرمان (اصله)

سال ۹۵	سال ۹۶	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰

۳- ذینفعان پروژه:

کمک به اقتصاد ملی و جلوگیری از خروج ارز از کشور جهت واردات روغن-بهره برداران بخش کشاورزی-سیستم حمل و نقل- واحد های خدماتی صنایع وابسته به بخش کشاورزی، ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعه.

۴- پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه:

- تامین منابع مالی
- تأمین نهال سالم
- توسعه صنایع تبدیلی

۵- شرح کلی پروژه:

طرح و پروژه ها توسط مجری طرح به ستاد سازمان ابلاغ و ستاد سازمان با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان ها تحت عنوان برنامه های محوری ابلاغ و اجرا می گردد.

۶- زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

ردیف	عنوان فاز	خروجی ملموس	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	اطلاع رسانی به کشاورزان	آگاهی کشاورز	اسفند	
۲	تأمین و غرس نهال	کاشت نهال	اسفند	فروردین
۳	نظارت بر کاشت نهال	رشد درخت	اسفند	فروردین
۴	داشت (کوددهی، آبیاری، هرس و...)	رشد	فروردین	اسفند
۵	تولید محصول	محصول تولید شده	۴ سال بعد از کاشت نهال	

۷- بودجه پروژه:

اعتبارات هزینه ای ۲۰۰۰ میلیون ریال
 اعتبارات تملکی ۲۶۷۲ میلیون ریال
 یارانه خرید بذر ۱۲۰۰ میلیون ریال
 تسهیلات نقدینگی ۹۰۰۰۰ میلیون ریال

۸- ساختار پروژه


مدیر پروژه: آقای سیدیعقوب موسوی مدیرکل جهاد
 کشاورزی جنوب استان
 وظایف و اختیارات: مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر
 حسن انجام کار را به عهده دارد.

مدیر زیر پروژه: آقای مهندس اسلام شاهرخی معاون

تولیدات گیاهی

زیر نظر مدیر پروژه مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت پیگیری در جهت تحقق عملیات اجرایی ابلاغی ستاد و رعایت الگوی کاشت و تولید و اجراء پروژه های مربوطه، نظارت بر اجرای کار، هماهنگی کلیه واحدهای مرتبط با پروژه، نظارت بر تأمین و توزیع نهاده ها، هماهنگی های بین ستاد و حوزه های اجرایی، انجام مناسب و بموقع عملیات اجرایی تولید محصول سالم و عرضه بموقع، هماهنگی جهت اطلاع رسانی و عقد قراردادهای، پیگیری امور تأمین و تخصیص منابع و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش را به عهده دارد. مدیریت باغبانی بعنوان مدیر فعالیت ها زیر نظر ریاست سازمان و معاون تولیدات گیاهی مطابق دستورالعمل های وزارتخانه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای کلیه پروژه های و هزینه کرد اعتبارات را دارد.

۹- ساختار شکست کار پروژه (WBS):

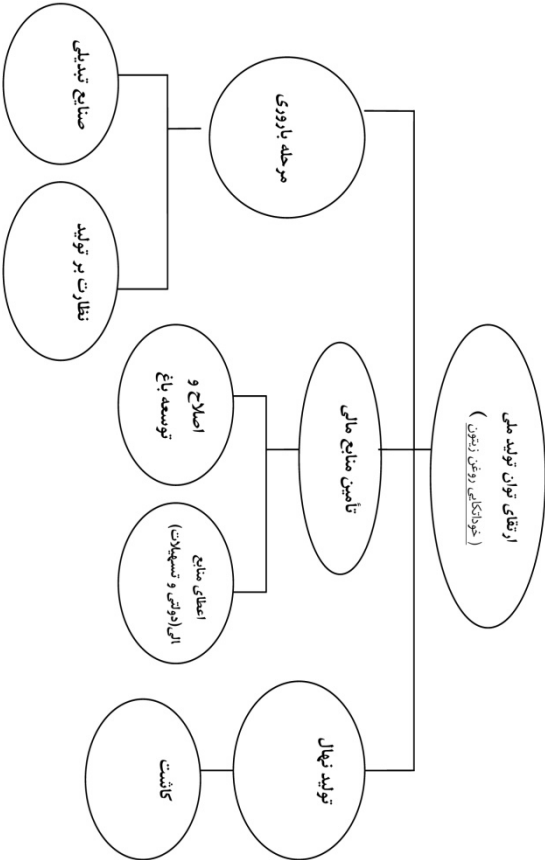

۱۰- برنامه زمانبندی

WBS کد	فعالیت	زمان آغاز	زمان پایان	خروجی ملموس	وزن فعالیت
۱	نظارت بر کاشت و داشت	۹۵/۱	۹۵/۱۲	آگاهی بهره بردار	۵
۲	داشت (آبیاری، کوددهی و...)	۹۵/۱	۹۵/۱۲	بهبود عملکرد	۶۰
۳	تولید محصول کنسروی	۹۵/۳	۹۵/۶/۳۰	زیتون جهت کنسرو	۱۵
۴	تولید محصول جهت تولید روغن	۹۵/۷/۱	۹۵/۹/۳۰	زیتون جهت روغن	۱۵
۵	نظارت و مساعدت در فرایند برداشت	۹۵/۳	۹۵/۹	محصول تولید شده	۵
